

**DITHMARSCHEN
DIGITAL**

Projektstatusbericht September 2024



**DITHMARSCHEN
DIGITAL**
www.dithmarschen-digital.sh

Zusammenfassung Projektstatusbericht


Alle laufenden Projekte befinden sich im Status „grün“.


Das Projekt der DigitalPatenschaft konnte erfolgreich beendet werden.

Fortschritte in den Projekten:

- DigitalPatenschaft
- Ehrenamtsbörse
- Online-Informationsportal für Jugend und Familie

Anzahl Projekte

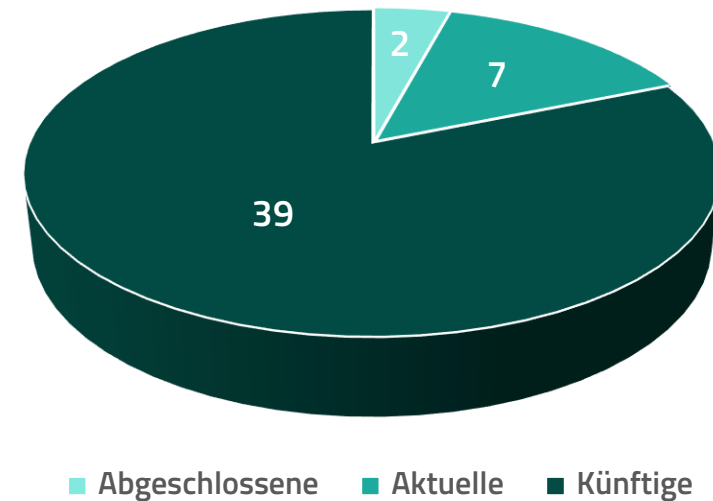



**DITHMARSCHEN
DIGITAL**

Projektstatus DigitalPatenschaft



**DITHMARSCHEN
DIGITAL**
www.dithmarschen-digital.sh

Projektstatus: DigitalPatenschaft

Projektleitung:	Carina Weber – Kreis Dithmarschen
Datum Status:	September 2024
Beteiligte Kooperationspartner:	Amt KLG Heider Umland, Amt Mitteldithmarschen

Projektstart:	01.01.2023
Projektende:	30.06.2024
Beteiligte Stakeholder:	lokal.digital Meldorf, OK Westküste, Nachbarschaftshilfe Büsum-Wesselburen, VHS Dithmarschen

Gesamtstatus



Projektziel:	Alle Bürger*innen im Kreis Dithmarschen besitzen die nötige digitale Kompetenz, um digitale Technologien sicher einzusetzen und digitale Angebote in Anspruch zu nehmen.
Projekthalt:	Die DigitalPat*innen sind Ehrenamtler*innen, die noch nicht digital affine Bürger*innen bei verschiedenen Aktivitäten rund um digitale Technologien und Angebote unterstützen. Dadurch gewährleisten sie die digitale Teilhabe aller Bürger*innen und fördern die digitale Kompetenz im Kreis Dithmarschen. Das Angebot adressiert ausschließlich Privatpersonen und die private Nutzung von Digitalisierung und stellt keine Konkurrenz zu bereits bestehenden kommerziellen Angeboten dar. Für die Hilfesuchenden ist die Unterstützung durch DigitalPat*innen kostenfrei.

Planung nächste Meilensteine




Kritische Punkte, sowie Risiken:	<ul style="list-style-type: none">• Ausfall der Projektbeteiligten• Keine Kapazitäten der extern Beteiligten• Erschwerte Suche der DigitalPat*innen
---	---

Projektstatus: DigitalPatenschaft

Projektleitung:	Carina Weber – Kreis Dithmarschen
Datum Status:	September 2024
Beteiligte Kooperationspartner:	Amt KLG Heider Umland, Amt Mitteldithmarschen

Projektstart:	01.01.2023
Projektende:	30.06.2024
Beteiligte Stakeholder:	lokal.digital Meldorf, OK Westküste, Nachbarschaftshilfe Büsum-Wesselburen, VHS Dithmarschen



Gesamter Sachstand:

Zu Beginn des Projektes wurde ein Konzept für die DigitalPatenschaft erstellt. In diesem wurden beispielsweise die Rahmendaten, der Funktionsumfang und die Zielgruppe festgelegt. Zusätzlich wurden Themen wie Verschwiegenheit, Datenschutz und Selbstauskunft behandelt.

In den nächsten Schritten wurde erarbeitet, wie neue DigitalPat*innen geschult bzw. informiert werden können, um ihre Tätigkeit bestmöglich aufnehmen zu können. Da wir das Ehrenamt gerne stärken möchten und diese Arbeit wertschätzen, wurde festgelegt, dass es eine pauschale Aufwandsentschädigung geben soll.

Weiterhin wurde ausgearbeitet, auf welchen Wegen potentielle DigitalPat*innen ihr Interesse bekunden können. Ebenfalls wurden verschiedene Kontaktwege für Hilfesuchende erarbeitet.

Um Hilfesuchenden die Möglichkeit zu bieten das Angebot auch außerhalb der eigenen Räumlichkeiten nutzen zu können, wurde öffentlich nutzbare Räumlichkeiten identifiziert. Ein wichtiger Meilenstein war weiterhin die organisatorische Ansiedlung des Projekts und die damit verbundene Betreuung. Die künftige Betreuung des Projektes wird durch das lokal.digital in Meldorf übernommen.

Im Dezember wurde durch die Kreispolitik die Anpassung der Entschädigungssatzung und somit die Ehrenamtspauschale für die DigitalPat*innen beschlossen. Die Anwerbung von ehrenamtlichen DigitalPat*innen wurde gestartet. Am 12.03. fand eine Informationsveranstaltung statt. Werbematerialien für die Hilfesuchenden sind abschließend erstellt. Ebenfalls wurde ein Ticketsystem eingeführt.

Fortschritt in der Berichtsphase:

Hilfesuchende in den Ämtern Heider Umland und Mitteldithmarschen können sich ab dem 01.10.2024 an das lokal.digital Dithmarschen wenden. Weitere Informationen hierzu gibt es unter folgendem Link:
[Informationen DigitalPatenschaft](#)

Das Projekt ist somit erfolgreich abgeschlossen.



**DITHMARSCHEN
DIGITAL**

Projektstatus Digitaler Marktplatz



**DITHMARSCHEN
DIGITAL**
www.dithmarschen-digital.sh

Projektstatus: Digitaler Marktplatz

Projektleitung:	Andreas Rohwedder – Amt Marne-Nordsee
Datum Status:	September 2024
Beteiligte Kooperationspartner:	Stadt Brunsbüttel

Projektstart:	01.03.2024
Projektende:	31.12.2025
Beteiligte Stakeholder:	Boyens Medien, Vereine, Verbände, Organisationen

Gesamt-status




Gesamter Sachstand:


Die grobe Planung des Projektes ist abgeschlossen.
Es wurde eine wöchentliche Austauschrunde der Projektbeteiligten eingerichtet.
Ebenfalls wurde mit dem Arbeitspaket der Qualifizierung und Quantifizierung von Daten gestartet. Hierbei soll eine Übersicht über die Gewerbetreibende des Amtes Marne-Nordsee und der Stadt Brunsbüttel erstellt werden.
Ein Prozess für eine Erstkontaktaufnahme und ein zugehöriger Leitfaden sind in Bearbeitung.
Mit Boyens Medien wurden weitere positive Gespräche zur Umsetzung geführt.
Das Projektteam wurde durch weitere Mitarbeiter aufgestockt.


Fortschritt in der Berichtsphase:

In der letzten Berichtsphase gab es keine weiteren Fortschritte.

 Projektfortschritt entspricht der Planung

 Es bestehen leichte Risiken, die durch den Projektverantwortlichen geklärt werden können

 Der Gesamterfolg des Projektes ist gefährdet



**DITHMARSCHEN
DIGITAL**

Projektstatus DorfFunk



**DITHMARSCHEN
DIGITAL**

www.dithmarschen-digital.sh

Projektstatus: Information der Ämter und Gemeinden über DorfFunk als lokales Kommunikationsmedium




Projektleitung:	Sven Struckmann – Amt Heider Umland
Datum Status:	September 2024
Beteiligte Kooperationspartner:	

Projektstart:	22.01.2024
Projektende:	31.12.2024
Beteiligte Stakeholder:	

Gesamtstatus

Projektziel:	Die Bürger*innen im Kreis Dithmarschen sind lokal mit Ihrer Verwaltung und ihren Mitmenschen vernetzt, pflegen ein aktives gesellschaftliches Leben und unterstützen sich gegenseitig.
Projekthalt:	<p>Im Rahmen des Projekts werden den Gemeinden im Amt Heider Umland Informationen zur Nachbarschafts-App „DorfFunk“ sowie ihrer Funktionalitäten und der beispielhaften Einführung zur Verfügung gestellt.</p> <p>Die Nachbarschafts-App ermöglicht der Verwaltung und den Gemeinden gezielt und niederschwellig mit ihren Bürger*innen zu kommunizieren. Durch die aktive Kommunikation wird die Wahrscheinlichkeit von Falschinformationen reduziert und mehr Nähe zwischen Politik / Verwaltung und den Bürger*innen geschaffen.</p> <p>Die App bietet Bürger*innen, Vereinen etc. außerdem die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen.</p>



Kritische Punkte, sowie Risiken:	<ul style="list-style-type: none">• Ausfall der Projektbeteiligten• Verzögerung aufgrund der Beteiligung vieler Interessensgruppen• Keine Kapazitäten der extern Beteiligten• Keine Akzeptanz und somit Nutzung durch Stakeholder
---	--

Projektstatus: Information der Ämter und Gemeinden über DorfFunk als lokales Kommunikationsmedium



Projektleitung:	Sven Struckmann – Amt Heider Umland
Datum Status:	September 2024
Beteiligte Kooperationspartner:	

Projektstart:	22.01.2024
Projektende:	31.12.2024
Beteiligte Stakeholder:	


Gesamt-status

Gesamter Sachstand:


Die grobe Planung des Projektes ist abgeschlossen.
Eine geplante Informationsveranstaltung für die Gemeinden musste verschoben werden und befindet sich in neuer Planung.
Ebenfalls wurden bereits erste Schnittstellen identifiziert.
Am 25.06. fand eine Informationsveranstaltung für die Gemeinden des Amtes Heider Umland statt.
Zum Ende des dritten Quartals soll mit einem gemeinsamen Marketing der teilnehmenden Gemeinden gestartet werden.
Für alle Gemeinden des Amtes sollen amtliche Mitteilungen in DorfFunk ausgespielt werden.
Weiterhin ist ein Workshop für interessierte Bürger*innen geplant.


Fortschritt in der Berichtsphase:

In der letzten Berichtsphase gab es keine weiteren Fortschritte.

 Projektfortschritt entspricht der Planung

 Es bestehen leichte Risiken, die durch den Projektverantwortlichen geklärt werden können

 Der Gesamterfolg des Projektes ist gefährdet



**DITHMARSCHEN
DIGITAL**

Projektstatus Ehrenamtsbörse




**DITHMARSCHEN
DIGITAL**
www.dithmarschen-digital.sh

Projektstatus: Ehrenamtsbörse


Projektleitung:	Matthes Reimann– Amt Büsum-Wesselburen
Datum Status:	September 2024
Beteiligte Kooperationspartner:	

Projektstart:	01.02.2024
Projektende:	31.03.2025
Beteiligte Stakeholder:	Ehrenamtskoordinatorin Amt Büsum-Wesselburen

Gesamtstatus 

Projektziel: Das Ehrenamt hat in Dithmarschen einen großen Stellenwert. Über die Ehrenamtsbörse findet jede*r Bürger*in das Ehrenamt, das zu ihm/ihr passt. Vereine und Verbände können sich vorstellen und „freie Stellen“ bekannt machen.

Projekthalt: Die Ehrenamtsbörse stellt eine multifunktionale Online-Plattform für Themen rund um das Ehrenamt dar. Primär geht es um die Besetzung offener Stellen im Ehrenamt. Dazu können Vereine und andere Organisationen ihre Gesuche veröffentlichen und interessierte Bürger*innen bekommen einen Überblick über die vorhandenen Optionen und Ansprechpartner*innen. Neben der Übersichtlichkeit soll zudem auf eine einfache Bedienbarkeit geachtet werden.



- Kritische Punkte, sowie Risiken:**
- Ausfall der Projektbeteiligten
 - Keine oder wenig Rückmeldungen der Vereine
 - Daten werden nicht aktuell gehalten

Projektstatus: Ehrenamtsbörse

Projektleitung:	Matthes Reimann– Amt Büsum-Wesselburen
Datum Status:	September 2024
Beteiligte Kooperationspartner:	

Projektstart:	01.02.2024
Projektende:	31.03.2025
Beteiligte Stakeholder:	Ehrenamtskoordinatorin Amt Büsum-Wesselburen


Gesamt-status 

Gesamter Sachstand:


Der Projektstart und die grobe Planung des Projektes sind erfolgt.
Es fand eine Identifizierung möglicher technischer Lösungen statt.
Ein erstes Austauschtreffen mit den Betreibern einer möglichen technischen Lösung hat stattgefunden.
Ebenfalls wurde an einer kurzen Schulung zu Nutzungsmöglichkeiten teilgenommen.
Das Amt Büsum-Wesselburen hat sich für die Nutzung der bestehenden Plattform der Aktion-Mensch entschieden.

Fortschritt in der Berichtsphase:

Die Einbindung der Ehrenamtsbörse in die Homepage des Amtes ist erfolgt.
Erste Einträge wurden ebenfalls vorgenommen.

 Projektfortschritt entspricht der Planung

 Es bestehen leichte Risiken, die durch den Projektverantwortlichen geklärt werden können

 Der Gesamterfolg des Projektes ist gefährdet



**DITHMARSCHEN
DIGITAL**

Projektstatus Flächendeckender LoRaWAN-Netzausbau



**DITHMARSCHEN
DIGITAL**
www.dithmarschen-digital.sh

Projektstatus: Flächendeckener LoRaWAN-Netzausbau



Projektleitung:	Carina Weber – Kreis Dithmarschen
Datum Status:	September 2024
Beteiligte Kooperationspartner:	Amt Mitteldithmarschen

Projektstart:	01.01.2023
Projektende:	31.12.2024
Beteiligte Stakeholder:	Land Schleswig-Holstein, LoRaWAN-Community #Nodes.SH

Gesamtstatus

Projektziel: Ein flächendeckendes LoRaWAN-Netz ist verfügbar.

Projekthalt: LoRaWAN-Netze erlauben die Sammlung von Daten aus so unterschiedlichen Bereichen wie Luftqualität, Pegelstände, Temperatur, Windrichtung, Feuchte, Verkehrsdichte, Personenzahlen, Parkplatzbelegung, CO2-Belastung in Innenräumen, Zustand von Geräten, Füllstände von Abfallbehältern usw.. In diesem Projekt soll ein flächendeckendes LoRaWAN-Netz aufgebaut werden. Darüber hinaus sollen mit lokalen Akteur*innen Use Cases für die konkrete Anwendung entwickelt werden.




- Kritische Punkte, sowie Risiken:**
- Ausfall der Projektbeteiligten
 - Keine Terminfindung mit der SH LoRaWAN-Community
 - Verzögerung beim Netzausbau durch das Land Schleswig-Holstein

Projektstatus: Flächendeckener LoRaWAN-Netzausbau

Projektleitung:	Carina Weber – Kreis Dithmarschen
Datum Status:	September 2024
Beteiligte Kooperationspartner:	Amt Mitteldithmarschen

Projektstart:	01.01.2023
Projektende:	31.12.2024
Beteiligte Stakeholder:	Land Schleswig-Holstein, LoRaWAN-Community #Nodes.SH

Gesamtstatus



Gesamter Sachstand:

Der Kreis Dithmarschen und das Amt Mitteldithmarschen haben sich der LoRaWAN-Community in Schleswig-Holstein angeschlossen. Im Rahmen von Arbeitsgruppentreffen mit mehreren Akteur*innen in Dithmarschen wurden die aktuellen Stände einzelner Beteiligten im Rahmen von LoRaWAN identifiziert. Gemeinsam fand eine Besichtigung im Showroom der SH Netz AG in Rendsburg statt. Dort konnten bereits bestehende Lösungen getestet und Inspirationen mitgenommen werden. In diesem Rahmen hat das Amt Mitteldithmarschen bereits die ersten Sensoren verbaut um sowohl die einzelnen Sensoren und auch das Handling insgesamt zu testen. Zudem wurde eine erste Auswahl an Anwendungsfällen identifiziert und auf der Projektseite von Dithmarschen Digital bereitgestellt. Im November konnte nun die Ausschreibung für den landesweiten LoRaWAN-Ausbau erfolgreich abgeschlossen werden. Im Amt Mitteldithmarschen liegt eine Übersicht der Zähler der eigenen Liegenschaften vor. Mit dieser soll die Umrüstung forciert werden. Zur Umrüstung der analogen Stromzähler auf digitale Zähler mit Sensoren fand eine erste Besprechung mit Verantwortlichen statt. Neben den eigenen Liegenschaften und dem Schulgebäude in Meldorf soll auch die Flüchtlingsunterkunft in Meldorf ausgestattet werden. Hierfür wird mit einer Testphase gestartet, um ab dem 01.01.2025 in die Umrüstung zu starten. Das Amt Mitteldithmarschen hat Prüfungen bezüglich einer Schnittstelle zwischen der bisher genutzten Software und den Sensoren zur Auswertung begonnen. Ein Angebot wurde angefordert.

Fortschritt in der Berichtsphase:

Ein Angebot der SH Netz AG steht weiterhin aus.



**DITHMARSCHEN
DIGITAL**

Projektstatus Flexibler Busshuttle




**DITHMARSCHEN
DIGITAL**
www.dithmarschen-digital.sh

Projektstatus: Flexibler Busshuttle

Projektleitung:	J. Pusch - SVG
Datum Status:	September 2024
Beteiligte Kooperationspartner:	Kreis Dithmarschen

Projektstart:	01.12.2022
Projektende:	31.12.2023
Beteiligte Stakeholder:	NAH.SH, ioki

Gesamtstatus



Projektziel: Bürger*innen können ihre Mobilitätsbedürfnisse befriedigen, ohne auf Busverbindungen mit festen Linien angewiesen zu sein.

Projekthalt: Die Flächenbedienung des öffentlichen Nahverkehrs einer Region soll mittels eines flexiblen Busshuttles erfolgen. Bei einer gewünschten Fahrt meldet der Fahrgast per Telefon oder App seinen Fahrtwunsch an. Zwischen den festen Start- und Endpunkten ist der Linienweg flexibel nach den Fahrtwünschen der Fahrgäste gestaltbar (solange die rechtzeitige Ankunft am Verknüpfungspunkt eingehalten werden kann). Zusätzlich ist die Schaffung virtueller Haltestellen angedacht, sodass der Fahrgast nicht mehr bis zur nächsten physischen Haltestellen kommen muss.

Fortschritt in der Berichtsphase:

--

Geplante Aktivitäten in den nächsten Berichtsphasen:


- Erstellung Beschlussvorlage der Politik

Kritische Punkte, sowie Risiken:

- Überschreitung des Budgets
- Geringe Akzeptanz durch Einwohner*innen

Nächste Meilensteine:

- Fertigstellung des Konzeptes
- Umsetzung des Konzeptes



**DITHMARSCHEN
DIGITAL**

**Projektstatus
Online-Informationportal
für Jugend und Familie**



**DITHMARSCHEN
DIGITAL**
www.dithmarschen-digital.sh

Projektstatus: Online-Informationsportal für Jugend und Familie (Regionalportal)



Projektleitung:	Carina Weber – Kreis Dithmarschen
Datum Status:	September 2024
Beteiligte Kooperationspartner:	

Projektstart:	01.11.2023
Projektende:	31.12.2026
Beteiligte Stakeholder:	

Gesamtstatus

Projektziel: Jugendliche und Familien finden für sie passende Angebote einfach und schnell über eine zentrale Plattform.

Projekthalt: Es gibt im Kreisgebiet bereits zahlreiche gute Angebote für Jugendliche und Familien; die Nutzer*innen müssen sich derzeit aber noch durch diverse Portale bzw. Websites von unterschiedlichen Angeboten klicken, um für sie passende Angebote zu finden, sofern diese digital verfügbar sind. In dem Online-Informationsportal werden die verfügbaren Angebote gebündelt und transparent dargestellt. Somit entsteht ein zentraler Anlaufpunkt, über den sich die Bürger*innen informieren können und Organisationen ihre Angebote besser vermarkten können.



- Kritische Punkte, sowie Risiken:**
- Ausfall der Projektbeteiligten
 - Verzögerungen aufgrund der Beteiligung vieler Interessengruppen intern / extern und damit höheren Abstimmungsaufwand
 - Keine Kapazitäten der extern Beteiligten
 - Erschwerte Suche der DigitalPat*innen



Projektstatus: Online-Informationsportal für Jugend und Familie (Regionalportal)

Projektleitung:	Carina Weber – Kreis Dithmarschen
Datum Status:	September 2024
Beteiligte Kooperationspartner:	

Projektstart:	01.11.2023
Projektende:	31.12.2026
Beteiligte Stakeholder:	

Gesamtstatus




Gesamter Sachstand:

Um das gesamte Portal aufbauen zu können, haben wir bei den AktivRegionen Dithmarschen und Eider-Treene-Sorge im November Fördermittel beantragt. Das Projekt wurde im Dezember auf den dortigen Vorstandssitzungen vorgestellt und positiv beschlossen. Die Vergabeunterlagen wurden vorbereitet. Der Förderbescheid ist eingegangen.

Fortschritt in der Berichtsphase:

Das formale Vergabeverfahren wurde erfolgreich abgeschlossen und der Auftrag wurde vergeben. Im Bereich der Sozialangebote wird derzeit eine Liste mit allen Anbieter*innen und Angeboten erstellt.



**DITHMARSCHEN
DIGITAL**

Projektstatus Positionierung der Bürgerportale



**DITHMARSCHEN
DIGITAL**
www.dithmarschen-digital.sh

Projektstatus: Positionierung der Bürgerportale

Projektleitung:	Marie Hasberg – Amt Mitteldithmarschen
Datum Status:	September 2024
Beteiligte Kooperationspartner:	Stadt Heide

Projektstart:	15.11.2023
Projektende:	31.12.2024
Beteiligte Stakeholder:	

Gesamtstatus 

Projektziel: Ein einheitliches Bürgerportal im gesamten Kreisgebiet, sowie steigende Nutzerzahlen durch Bürger*innen.

Projekthalt: 2022 haben alle Ämter und Städte das Bürgerportal eingeführt. Bisher lässt sich ein Nutzen des Portals leider nur bedingt feststellen. Durch einen monatlichen Auswertungsbericht lässt sich die Zahl der Bürger*innen, welche das Portal nutzen, einsehen. Es sollen Marketingmaßnahmen positioniert werden und ein Kommunikationskonzept zwischen den einzelnen Verwaltungen angestrebt werden.



- Kritische Punkte, sowie Risiken:**
- Fehlende Zusammenarbeit zwischen den Verwaltungen
 - Technische Hindernisse
 - Unterschiedliche Auffassungen bezüglich „einheitlichem Bürgerportal“

Projektstatus: Positionierung der Bürgerportale

Projektleitung:	Marie Hasberg – Amt Mitteldithmarschen
Datum Status:	September 2024
Beteiligte Kooperationspartner:	Stadt Heide

Projektstart:	15.11.2023
Projektende:	31.12.2024
Beteiligte Stakeholder:	

Gesamt-status 

Gesamter Sachstand:

Beim Amt Mitteldithmarschen fand eine erste interne Zusammenkunft zum Auftakt des Projektes statt. Kritische Punkte, ebenso wie Ziele, die zu einem erfolgreichen Projektabschluss beitragen sollen, wurden gesammelt und gelistet. Ziel des Projektes sollte sein, ein einheitliches Bürgerportal zu schaffen, welches ständig aktualisiert wird. Bürger*innen sollen selbsterklärend das Bürgerportal nutzen können und um die Vorteile wissen. Zur Bewerbung der Portale wurden Marketingfirmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. Eine Entscheidung steht noch aus. Zudem konnte die Pilotierung der elektronischen Wohnsitzanmeldung bei der Stadt Heide erfolgreich abgeschlossen werden. Das vorliegende Angebot einer Marketingagentur soll angenommen werden, sodass kurzfristig mit der Umsetzung einer Marketingkampagne gestartet werden kann.

Fortschritt in der Berichtsphase:

In der letzten Berichtsphase gab es keine weiteren Fortschritte.
